Arbeidsplaat: I:\Projecten\30000 t/m 34999\30009\Tekening\Dgtekeningen\Plattegrond 2e verdieping.dwg
Tstatd plaut: 05/01/17 Projecten\30000 t/m 34999\30009\Tekening\Dgtekeningen\Tstatd plaut 5051.dwg
XC_BMV_VL_PLUS_5051 - Floor Plan - ST_VL_Luchtrioolafdek - Tussenlaag (I:\30000\30009\Tekening\Dgtekeningen\XC_BMV_VL_PLUS_5051 - Floor Plan - ST_VL_Luchtrioolafdek - 01 eerste verdieping.dwg)
XC_BMV_VL_PLUS_5051 - Floor Plan - ST_VL_Luchtrioolafdek - Tussenlaag (I:\30000\30009\Tekening\Dgtekeningen\XC_BMV_VL_PLUS_5051 - Floor Plan - ST_VL_Luchtrioolafdek - Tussenlaag.dwg)
Xrefs 27 Juni 2016-01-27[] opgeschoond (I:\Projecten\30000 t/m 34999\30009\Tekening\Dgtekeningen 27 Juni 2016-01-27[] opgeschoond.dwg)

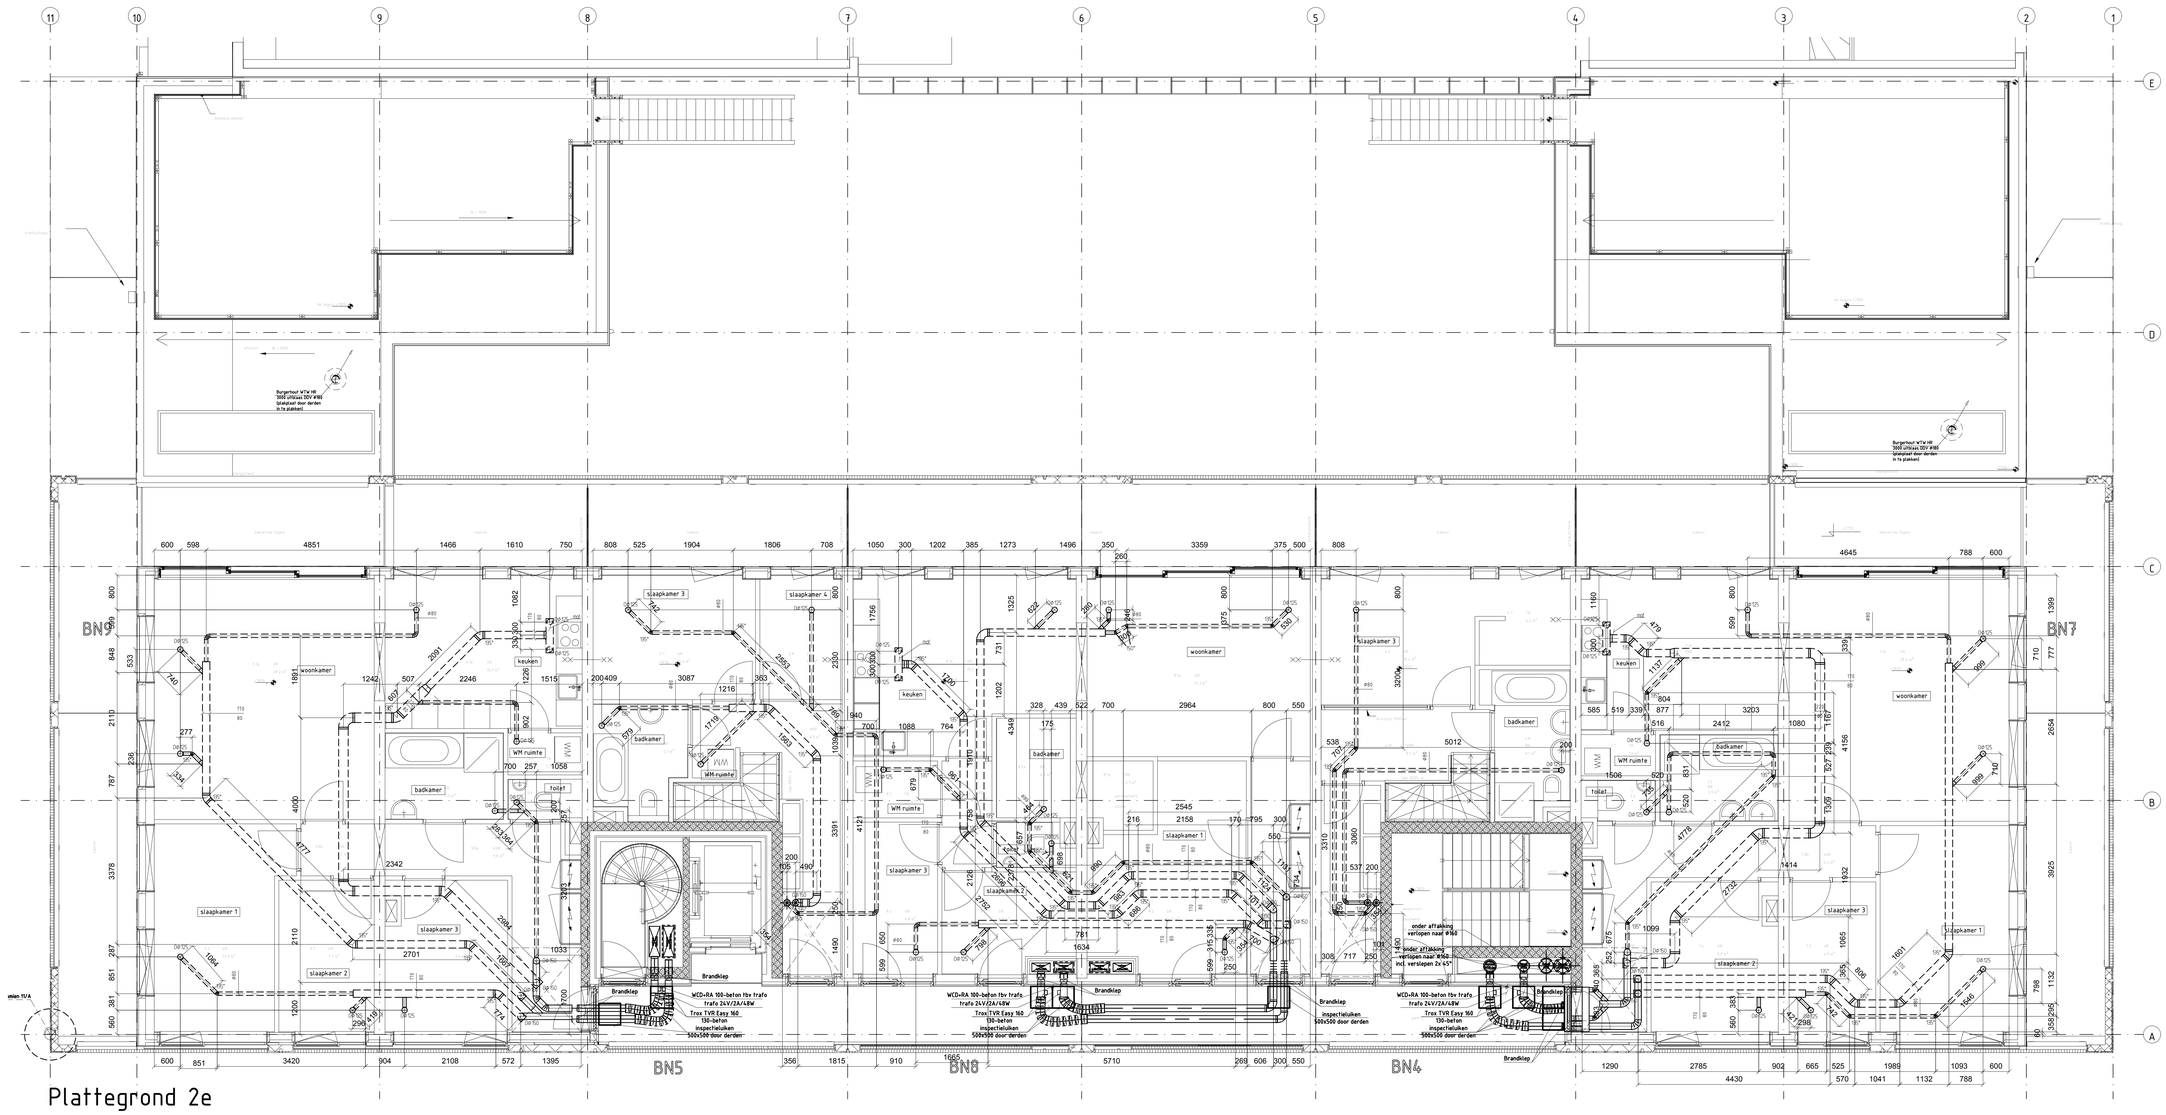

Plattegrond 2e verdieping







Bwnr. 4

mechanische toevoer per ruimte	
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	45 m3/h
slaapkamer 1	45 m3/h
slaapkamer 2	45 m3/h
slaapkamer 3	45 m3/h
totaal	270 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

mechanische afvoer per ruimte	
keuken	72 m3/h
keuken	filter 72 m3/h
badkamer	50 m3/h
badkamer	50 m3/h
wasmachine ruimte	25 m3/h
totaal	270 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

Bwnr. 5

mechanische toevoer per ruimte	
woonkamer	32 m3/h
woonkamer	32 m3/h
woonkamer	32 m3/h
woonkamer	32 m3/h
woonkamer	32 m3/h
slaapkamer 1	30 m3/h
slaapkamer 2	30 m3/h
slaapkamer 3	filter 35 m3/h
slaapkamer 4	25 m3/h
totaal	280 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

mechanische afvoer per ruimte	
keuken	65 m3/h
keuken	65 m3/h
badkamer	50 m3/h
badkamer	50 m3/h
wasmachine ruimte	50 m3/h
totaal	280 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

Bwnr. 7

mechanische toevoer per ruimte	
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	45 m3/h
slaapkamer 1	30 m3/h
slaapkamer 2	30 m3/h
slaapkamer 3	25 m3/h
totaal	220 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

mechanische afvoer per ruimte	
keuken	60 m3/h
keuken	60 m3/h
badkamer	50 m3/h
toilet	25 m3/h
wasmachine ruimte	25 m3/h
totaal	220 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

Bwnr. 8

mechanische toevoer per ruimte	
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	30 m3/h
woonkamer	30 m3/h
slaapkamer	50 m3/h
slaapkamer	25 m3/h
slaapkamer	25 m3/h
totaal	200 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

mechanische afvoer per ruimte	
keuken	35 m3/h
keuken	40 m3/h
badkamer	50 m3/h
toilet	25 m3/h
wasmachine ruimte	50 m3/h
totaal	200 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

Bwnr. 9

mechanische toevoer per ruimte	
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	45 m3/h
woonkamer	45 m3/h
slaapkamer 1	30 m3/h
slaapkamer 3	30 m3/h
slaapkamer 2	25 m3/h
totaal	220 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

mechanische afvoer per ruimte	
keuken	60 m3/h
keuken	60 m3/h
badkamer	50 m3/h
toilet	25 m3/h
wasmachine ruimte	25 m3/h
totaal	220 m3/h

waardes gemeten in de hoogste stand

Hulsjes in de vloeren -> Instortpotten zonder rit toepassen!

bemar

REVISIE TEKENING
VENTILATIETECHNIEK BV
p.b. 3705 MN ZG, Attikastraat 20, Hoevelaken, tel.: 0175-567111

schaal: 1:50	
datum: 22-12-2016	
project: 32 app. "PUUUR BSH" te Amsterdam Buiksloterham te Amsterdam Warmte terugwinning	getekend: M. Wolters
	werknummer: 30.009
wbh type: 2e verdieping	bladnummer: R05
opdrachtgever: Vink Bouw BV	aantal bladen: -

Tekening: T:\Projecten\30000 t/m 34999\30009\Tekening\Revisies\R20\30009 - 32 Amsterdam - appartementen.dwg Gepast 05-01-2017 - 17:21:42 Door: winther Met: Autocad 2010 / Nordinet 8.3
Nordinet Prequest
